

Bogotá, Diciembre 28 de 2023

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

CLIC SEGURO

A. DATOS DEL PROYECTO

Tipo de convenio	Interadministrativo
Nombre del proyecto	<p>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las competencias en seguridad digital de las personas en general para aumentar la confianza en el uso del entorno digital, en desarrollo de las actividades del Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia – COLCERT coordinado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Alcance:</p> <p>Con este convenio se espera llegar a treinta mil (30.000) beneficiarios del territorio nacional con programas de sensibilización para fortalecer sus capacidades en seguridad digital, incluyendo en esa focalización, además, capacitar a treinta (30) funcionarios del MinTIC bajo la misma temática.</p>
Entidad	MinTic
Fecha Inicio	17 de noviembre de 2022
Plazo de ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Valor	<p>Teniendo en cuenta los aportes del Fondo Único de TIC y los aportes en especie a ejecutar por parte de RENATA, se establece el valor del convenio hasta en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.209.433.454).</p>
Lugar de ejecución	Los compromisos derivados del convenio tendrán como sede principal la ciudad de Bogotá D.C., sin embargo, su ámbito de ejecución será el territorio nacional.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

B. INFORME DEL PROGRESO Y RESULTADOS DEL PROYECTO

B.1 Desarrollo de los objetivos planteados.

Objetivo General: Mejorar las competencias en seguridad digital de las personas en general para aumentar la confianza en el uso del entorno digital.

Objetivo 1: Proporcionar formación en ciberseguridad adaptada a las necesidades de la población colombiana a través de espacios de sensibilización, con el fin de aumentar el conocimiento y la conciencia de los riesgos cibernéticos entre los diferentes grupos poblacionales.

Objetivo 2: Mejorar los niveles de apropiación de la Política de Seguridad Digital en las entidades públicas y organizaciones privadas, así como en los diferentes actores del ecosistema digital, a través del desarrollo de herramientas que apoyen el cumplimiento de la Política.

Objetivo 3: Disminuir la brecha con respecto a la postura de seguridad en el territorio Nacional a través de instrumentos que faciliten la comunicación a las diferentes poblaciones del país.

B2. AVANCE TÉCNICO - Actividades realizadas y resultados alcanzados

En este informe se presentan los resultados del desarrollo y ejecución de las actividades programadas para el desarrollo del proyecto con fecha del 27 de diciembre de 2023.

Los anexos de este informe se pueden consultar en la siguiente carpeta compartida:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JeAh5-k3MTeQBjZqtbsHKgkvuscmaqW0>

Para reconocer el estado de las actividades, se han identificado cada una de ellas con un color para identificarlas de la siguiente manera:

	Actividad finalizada
	Actividad en ejecución
	Actividad sin comenzar

A continuación, se presentan las actividades, su porcentaje de desarrollo y las evidencias de lo ejecutado desde el inicio del convenio:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Número de esquema	Nombre	Peso	Semana 1 21 al 27 nov	Semana 2 27 Nov al 04 Dic	Semana 3 05 al 11 Dic	Semana 4 12 al 18 de Dic	Semana 5 19 al 25 de Dic	Semana 6 25 al 31 de Dic	Acumulado
1.0	KICKOFF								
1.0.1	Presentación del equipo de trabajo de RENATA	1%	1,00%						1,0%
1.0.2	Socialización metodología de trabajo	1%	1,00%						1,0%
1.0.3	Socialización del plan de trabajo	1%	1,00%						1,0%
1.0.4	Socialización plan de comunicaciones	1%	1,00%						1,0%
1.0.5	Socialización matriz de riesgos	1%	1,00%						1,0%
1.1	FASE 1: ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA								
1.1.1	Entrega cronograma detallado de trabajo	3%	3%						3,0%
1.1.2	Análisis de mercado y necesidades regionales.	5%		2,50%	2,00%	0,50%			5,0%
1.1.3	Definición de socios y colaboradores regionales y locales	4%		2,00%	1,00%	1,00%			4,0%
1.1.4	Construcción de un mapa de ruta que contenga el temario de los cursos, workshop y multimedias	3%	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%			3,0%



1.0.1 Presentación del equipo de trabajo de Renata

Para el desarrollo del proyecto se consolidó un equipo de trabajo que tiene las siguientes características:

Ítem	Perfil	Cant	Dedicación	Nombre
1	Gerente de proyecto	1	100%	Andrés Pareja
2	Desarrollador De Contenidos- Diseñador Instruccional	1	50%	Jennifer Gonzalez
3	Profesional de diseño y comunicaciones	1	100%	Ana Maria Pineda
4	Líder tecno pedagógico	1	80%	Myriam S Fernández
5	Especialista en sistemas de información y estrategias de formación virtual	1	50%	Rocio Guevara

Este equipo de trabajo presentó su perfil profesional y acreditó su experiencia para cada uno de los cargos mencionados

1.0.2 Socialización de la metodología de trabajo

FICHA TÉCNICA Y ALCANCE DEL PROYECTO

HITOS

- Fase 1: ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
- Fase 2: DESARROLLO DE CONTENIDO Y HERRAMIENTAS
- Fase 3: IMPLEMENTACIÓN REGIONAL
- Fase 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN
- Fase 5: ESCALADO Y EXPANSIÓN

ALCANCE

Desarrollar competencias en seguridad digital de hasta 10.000 habitantes del territorio nacional para aumentar la confianza en el uso del entorno digital a través de programas de sensibilización que fortalezcan las capacidades en seguridad digital.

IMPACTO

- a) Fortalecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector privado.
- b) Actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital.
- c) Adoptar modelos, estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis nuevas tecnologías.

EQUIPO DE TRABAJO

- Gerente de proyecto
- Líder técnico
- Equipo de comunicaciones y mercadeo
- Equipo de desarrollo y virtualización de contenidos
- Administrador de contenidos y plataformas
- Expertos temáticos en seguridad digital y ciberseguridad
- Equipo transversal de apoyo administrativo

VALOR

Aporte MinTIC	\$ 2.942.500.000
Aporte RENATA	\$ 303.840.000
Total aportes	\$ 3.246.340.000
Convenio	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fase 1: \$ 1.177.000.000 (40%)
Fase 2: \$ 1.177.000.000 (40%)
Fase 3: \$ 588.500.000 (20%)

* Es importante mencionar que se entregaran certificados de asistencia a máximo 1800 ciudadanos que se capaciten.



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.0.3 Socialización el plan de trabajo

El plan de trabajo se presentó y se discutió en varias reuniones iniciales en donde se alinearon conceptos y se definieron los alcances, objetivos y metas del proyecto de manera que todo el equipo tuviera la misma información.

Anexo N. 1: Plan de Trabajo – Clic Seguro

1.0.4 Socialización del plan de comunicaciones

El documento construido como plan de comunicaciones fue presentado al equipo de trabajo para que cada uno conozca el conducto regular para escalar los temas relacionados con el proyecto y para que se haga la entrega efectiva de cada uno de los compromisos asignados en los tiempos establecidos.

Anexo 2: Plan de comunicaciones

1.0.5 Socialización de la matriz de riesgos

La matriz de riesgos se construyó teniendo en cuenta los aspectos, circunstancias, situaciones y restricciones a las que se expone el proyecto en su normal ejecución y fue presentada por el Gerente del Proyecto al equipo de trabajo a manera de reconocer cualquiera de estas situaciones y que se tenga el lineamiento adecuado para resolver la situación.

Anexo 3: Matriz de riesgos

1.1 Fase 1: Análisis, planificación y metodología

1.1.1 Entrega del cronograma detallado de trabajo

El cronograma fue construido para conocer a detalle el avance que el proyecto debe presentar semanalmente y socializado al equipo de trabajo con el ánimo de que se conozcan los tiempos y las responsabilidades de cada uno de los roles en su éxito y ejecución.

Anexo 4: Cronograma detallado de Trabajo

1.1.2 Análisis de mercado y necesidades regionales

Anexo 5: Documento Análisis de mercado y necesidades regionales

1.1.3 Definición de socios y colaboradores regionales y locales



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.1.4 Construcción de un mapa de ruta que contenga el temario de los cursos, workshop y multimedias

Anexo 6: Mapa de ruta del proyecto Clic Seguro

Número de esquema	Nombre	Peso	Semana 1 21 al 27 nov	Semana 2 27 Nov al 04 Dic	Semana 3 05 al 11 Dic	Semana 4 12 al 18 de Dic	Semana 5 19 al 25 de Dic	Semana 6 25 al 31 de Dic	Acumulado
1.2	FASE 2: DESARROLLO DE CONTENIDO Y HERRAMIENTAS								
1.2.1	Diseño y desarrollo de programas de formación	7%	3,00%	2,00%	2,00%				7,0%
1.2.2	Estructura de material requerido para la ejecución de los workshops	2%	2,00%						2,0%
1.2.3	Estructurar el material didáctico de la política de seguridad digital	2%	2,00%						2,0%
1.2.4	Estructurar las plantillas que permitan apoyar a las entidades y MiPymes del territorio colombiano en el despliegue de la estrategia de comunicación interna	5%			2,00%	2,00%	1,00%		5,0%
1.2.5	Creación de materiales de marketing y sensibilización.	4%			2,00%	1,50%	1,50%		5,0%



contactenos@renata.edu.co



[\(601\) 5185353](tel:(601)5185353)

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.2.1 Diseño y desarrollo de programas de formación

El diseño y desarrollo de los programas de formación presenta la temática y del desarrollo de los cursos.

Una vez aprobados los cursos, se procedió a hacer el diseño y montaje de los cursos en la plataforma en la que será impartida la capacitación de cada ciudadano establecido en la meta.

El diseño y desarrollo de los 4 módulos se entregan como anexo 1,2,3,y 4 al presente informe.

Anexo 7: Modulo 1

Anexo 8: Modulo 2

Anexo 9: Modulo 3

Anexo 10: Modulo 4

1.2.2 Estructura de material requerido para la ejecución de los workshop

Se presentó un documento que contiene la estructura del material requerido en los workshop.

Anexo 11: Documento de estructuración de workshop

1.2.3 Estructurar el material didáctico de la política de seguridad digital.

Se presentan los cursos en Scorm:

Anexo 12: Modulo 1

Anexo13: Modulo 2

Anexo 14: Modulo 3

Anexo 15: Modulo 4

Contáctenos



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.2.4 Estructurar las plantillas que permitan apoyar a las entidades y MiPyMes del territorio colombiano en el despliegue de la estrategia de comunicación interna.

El kit contiene los siguientes elementos:

- 1 video animado



- 1 cartilla digital



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

- 1 infografía digital



- 4 cursos cortos en Seguridad Digital
- Acceso a través de código QR

Acceso:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.2.5 Creación de materiales de marketing y sensibilización.

Se hizo el diseño del logo para el proyecto, quedando aprobada la siguiente imagen:



Así mismo, se presentaron los diseños de los siguientes elementos que van a estar presentes en los workshop:

PENDON:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

El pendón tiene unas medidas de 2X1 y acompaña a los eventos ubicándolo en la entrada del evento.

BACKING:



El pendón tiene unas medidas de 3X2 y acompaña a los eventos ubicándolo al interior del recinto donde se lleven a cabo los workshop

ESCARAPELAS



Las escarapelas se les entregan a los asistentes que se registren, ingresen y participen del evento.



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Imagen gráfica en la dotación:



Número de esquema	Nombre	Peso	Seman a 1 21 al 27 nov	Seman a 2 27 Nov al 04 Dic	Seman a 3 05 al 11 Dic	Seman a 4 12 al 18 de Dic	Seman a 5 19 al 25 de Dic	Seman a 6 25 al 31 de Dic	Acumulado
1.3	FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS								
1.3.1	Crear expectativas y fomentar la participación en las distintas estrategias propuestas para las regiones	2%			0,50%	1,00%	0,50%		2,0%
1.3.2	Implementar bajo esquemas metodológico s especializados los programas de formación y sensibilización	5%			1,50%	2,00%	1,50%		5,0%



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.3.3	Publicación del material didáctico creado para la divulgación de la política de seguridad digital	1%		0,50%	0,50%			1,0%
1.3.4	Ejecutar un total de dos (2) workshops presenciales en la región central	3%		3,00%				3,0%
1.3.5	Entregar los kits desarrollados para apoyar a las entidades y MiPymes de la región central	3%		1,00%	1,00%	1,00%		3,0%
1.3.6	Transferencia de conocimiento en seguridad digital a treinta (30) funcionarios del MinTIC con base a las temáticas propuestas dentro del anexo técnico.	4%		4,00%				4,0%
1.3.7	Monitoreo y evaluación continua con base a los KPIs formulados para brindar el alcance indicado en la meta de	2%		1,00%	0,50%	0,50%		2,0%



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353

Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	30.000 ciudadanos								
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3.1 Crear expectativas y fomentar la participación en las distintas estrategias propuestas para las regiones

comunicaciones

1.3.2 Implementar bajo esquemas metodológicos especializados los programas de formación y sensibilización

Informe de los **38.076** capacitados en Seguridad Digital

El pasado 6 de diciembre de 2023 se dio inicio a las capacitaciones de los ciudadanos en donde uno a uno se registraron en el aplicativo diseñado especialmente para el desarrollo de esta actividad una vez cada uno de los participantes vio los 4 cursos diseñados. Con corte al 15 de diciembre se alcanzaron 358.076 capacitados bajo esta modalidad. Con este informe se reporta un cumplimiento de la meta propuesta del **168,48%**

La estrategia de despliegue para alcanzar los capacitados involucra la conformación de cuadrillas que se distribuyen por todo el territorio nacional y van capacitando a las personas en los 4 cursos que se encuentran cargados en un dispositivo móvil (tableta) que tiene cada uno de los encuestadores.


Con el equipo de campo se logró llegar a las siguientes regiones y departamentos del territorio nacional:

Región Pacifico	Cauca
	Chocó
	Antioquia
Región Eje Cafetero	Caldas
	Quindío
	Risaralda
Región Central	Cundinamarca
	Tolima
	Boyacá
Región Caribe	Atlántico



		Bolívar
		La Guajira
		Magdalena
		Cesar
Región Santanderes		Norte de Santander
		Santander
Región Llanos		Casanare
		Guaviare
		Caquetá
		Meta
		Arauca
Región Amazonía		Amazonas
		Putumayo
		Nariño

Los 38.076 capacitados se encuentran distribuidos por regiones según la siguiente gráfica:

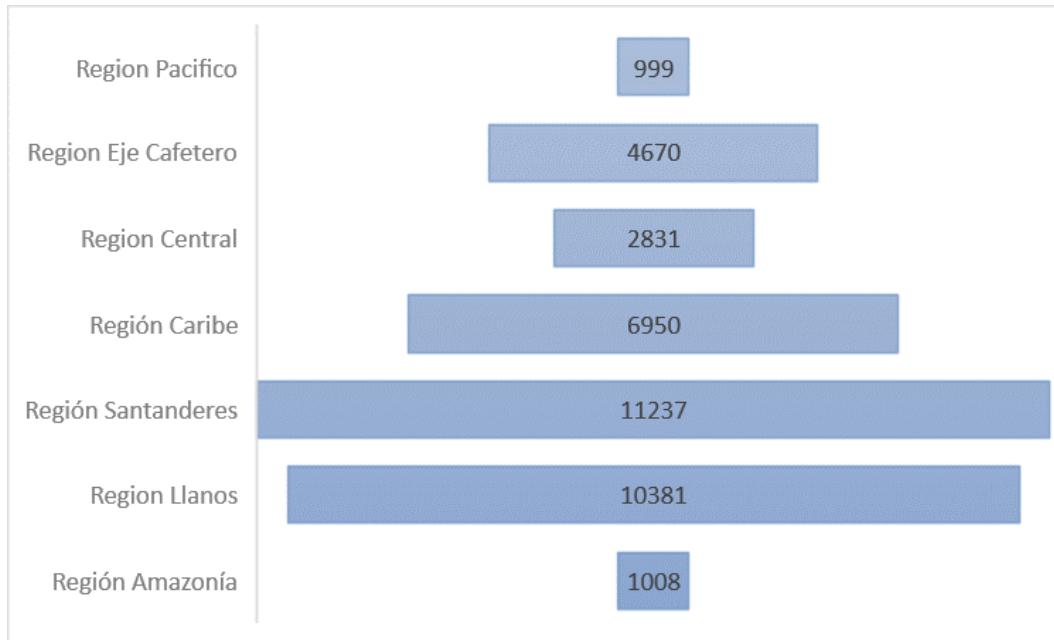

Distribución de los 38.076 capacitados en las regiones establecidas en el Anexo Técnico del proyecto



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353




Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Es así como se tiene que al 28 de diciembre de 2023 ya se tienen ciudadanos capacitados en los cursos cortos en las regiones propuestas en el anexo técnico del proyecto Clic Seguro siendo la Región de los Llanos y la Región Caribe las que llevan la delantera en el despliegue y en el impacto a los ciudadanos capacitados.

En la siguiente gráfica está representado que el **56,77%** de los capacitados se encuentran en las Regiones de los Llanos y la Región de Santanderes.



Participación porcentual de los capacitados en cursos cortos por cada región:

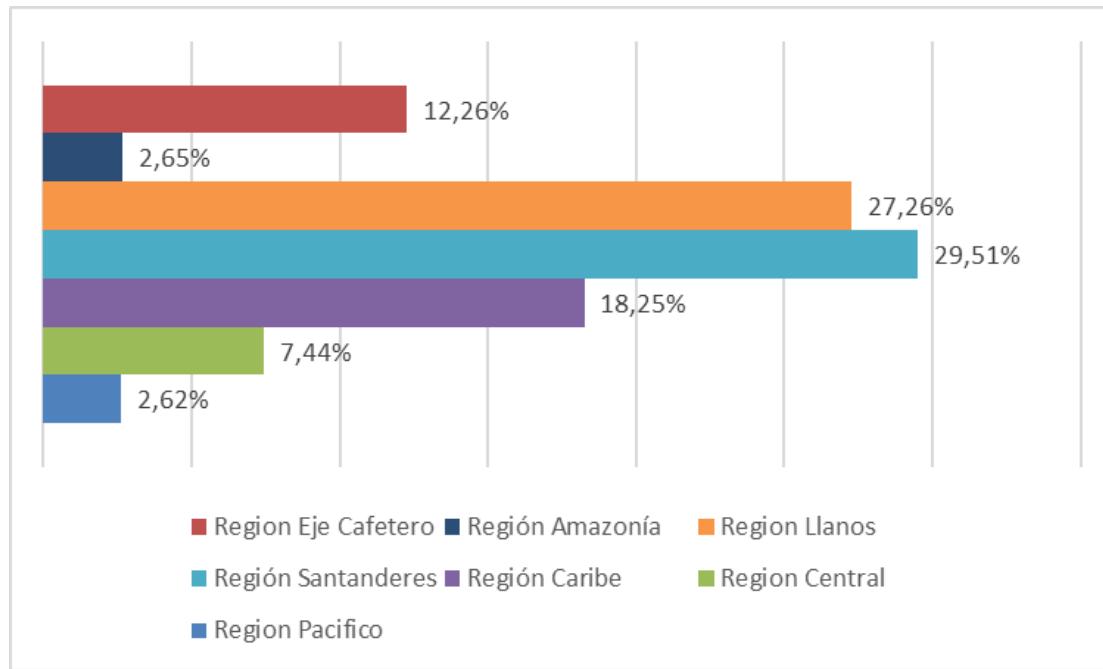

Fuente: Elaboración propia



contactenos@renata.edu.co




Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Comportamiento de capacitaciones uno a uno a nivel nacional:

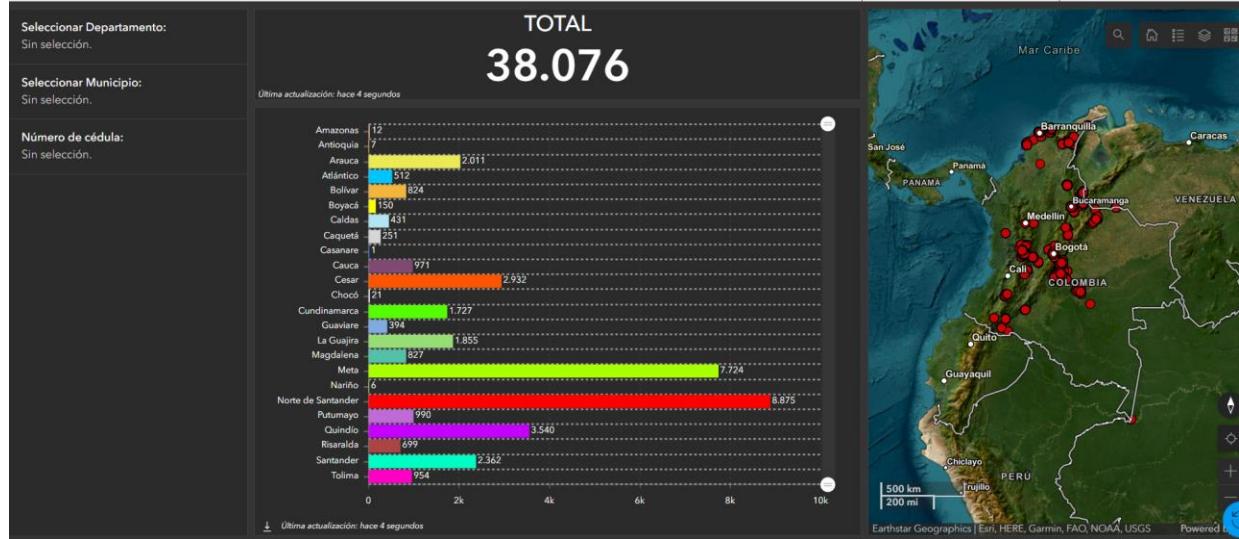

Porcentaje de participación de los 38.076 capacitados por regiones

El convenio interadministrativo propone el siguiente apartado:

“Por medio de los canales y las diferentes campañas de comunicación de RENATA y MinTIC, propuestas para el desarrollo del proyecto, se crearán expectativas y se fomentará la participación en las distintas estrategias propuestas para fortalecer la seguridad digital en el país, especialmente en las siguientes regiones:

- Región Pacífico - Quibdó y Popayán.
- Región Eje Cafetero - Pereira y Manizales.
- Región Central - Bogotá e Ibagué.
- Región Caribe – Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
- Región de los Santanderes - Bucaramanga y Valledupar.
- Región Llanos - Villavicencio y Florencia.
- Región Amazonia - Leticia y Puerto Asís. ”

En este entendido, se presenta en la siguiente tabla la distribución de capacitaciones por regiones y dentro de ellas se señalan las ciudades propuestas en el anexo técnico y a las cuales el equipo de trabajo ha logrado llevar para capacitar en los cuatro cursos cortos:

Detalle del número de capacitados por región, departamento y municipio:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

El documento técnico propone las regiones en las cuales quiere hacer presencia el proyecto “Clic Seguro” y dentro de ellas, se describen 15 ciudades para el desarrollo del proyecto, estas regiones y ciudades se describen de la siguiente manera:

Región	Departamento	Municipio	Cantidad Capacitados	Ciudades propuestas
Región Pacifico	Antioquia	Guatapé	3	
		Medellín	4	
	Chocó	Quibdó	21	◆
		Popayán	778	◆
	Cauca	Timbío	193	
Región Eje Cafetero	Caldas	Chinchiná	1	◆
		Manizales	406	
		Manzanares	1	
		San José	23	
	Quindío	Armenia	2357	
		Calarcá	45	
		Circasia	893	
		Filandia	8	
		La Tebaida	90	
		Salento	147	
	Risaralda	Dosquebradas	29	
		La Virginia	3	
		Pereira	667	
Region Central	Boyacá	Chitaraque	138	◆
		Oicatá	11	
		Tunja	1	
	Cundinamarca	Bogotá, D.C.	534	◆
		Cáqueza	118	
		Chía	39	
		Chipaque	566	
		El Rosal	9	
		Facatativá	85	
		Gachancipá	148	
		Guayabetal	5	
		Zipaquirá	223	
	Tolima	Chaparral	311	
		Espinal	98	
		Ibagué	239	◆
		Rioblanco	306	



Región Caribe	Atlántico	Barranquilla	347	◆	
		Galapa	27		
		Luruaco	1		
		Malambo	10		
		Puerto Colombia	46		
		Sabanagrande	26		
		Soledad	55		
	Bolívar	Cartagena De Indias	820	◆	
		El Carmen De Bolívar	3		
		Magangué	1		
	Cesar	Aguachica	2		
		La Paz	12		
		Manaure Balcón Del Cesar	1024		
		Pueblo Bello	389		
		Río De Oro	15		
		Valledupar	1490	◆	
	La Guajira	El Molino	5		
		Maicao	20		
		San Juan Del Cesar	1431		
		Urumita	1		
	Magdalena	Villanueva	398		
		Ciénaga	190		
		Santa Marta	637		
Región Santanderes	Arauca	Arauca	878	◆	
		Arauquita	2		
		Saravena	40		
		Tame	1091		
	Norte de Santander	Cácota	8		
		Chitagá	31		
		Cúcuta	3161		
		Cucutilla	4		
		Labateca	912		
		Los Patios	1621		
		Ocaña	2048		



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

		Pamplona	9	
		Silos	1	
		Toledo	1006	
		Villa Del Rosario	74	
Santander		Aratoca	1	
		Bucaramanga	588	◆
		Floridablanca	1616	
		Gámbita	50	
		Girón	7	
		Piedecuesta	100	
Region Llanos	Casanare	Paz De Ariporo	1	
		San José Del Guaviare	394	
		Florencia	251	◆
	Meta	Acacías	532	
		Castilla La Nueva	3	
		El Castillo	1	
		Fuentedeoro	1328	
		Granada	2283	
		Guamal	91	
		La Macarena	1	
		Lejanías	31	
		Mesetas	35	
		Puerto Concordia	218	
		Puerto Lleras	169	
		Puerto Rico	2	
		Restrepo	5	
		San Carlos De Guaroa	1	
	Región Amazonía	San Juan De Arama	305	
		San Martín	308	
		Villavicencio	2361	◆
		Vistahermosa	50	◆◆
Región Amazonía	Amazonas	Leticia	12	◆◆
	Nariño	Pasto	6	
	Putumayo	Mocoa	783	



		Orito	11		
		Puerto Asís	196		◆
Total capacitados con corte al 15 de diciembre de 2023					38076

De las 15 ciudades propuestas en el anexo técnico se tiene que las capacitaciones se lograron en cada una de las ciudades priorizadas

Anexo N. 16: Base de datos con los 38.076 registros de ciudadanos capacitados en la modalidad de workshop. La base de datos es entregada en Excel.

1.3.3 Publicación del material didáctico creado para la divulgación de la política de seguridad digital

comunicaciones

1.3.4 Ejecutar un total de dos (2) workshops presenciales en la región central

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo 13 workshop en la región Central, alcanzando 2.783 personas capacitadas que corresponden al 35% de la meta alcanzada.

#	WP N.	Fecha del workshop	Departamento	Ciudad	Coordinador	Cantidad de asistentes	Informe en el que se reporta
1	10	15/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	165	4
2	11	15/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	100	4
3	13	16/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	167	4
4	14	16/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	327	3
5	16	17/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	128	4



6	17	17/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	133	4
7	18	17/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	334	4
8	20	18/Dic/23	Cundinamarca	Chinauta	Elizabeth Sanchez	296	4
9	26	19/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	100	4
10	27	19/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	308	4
11	30	20/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	162	5
12	34	21/Dic/23	Tolima	Rioblanco	Gustavo Romero	415	5
13	36	22/Dic/23	Cundinamarca	Supatá	Elizabeth Sanchez	148	5
Total asistentes a la fecha						2.783	

1.3.5 Entregar los kits desarrollados para apoyar a las entidades y MiPymes de la región central

A través de correos electrónicos, se les están enviando a las Mipymes la invitación para acceder a través del QR a la información del KIT diseñada, desarrollada y dispuesta para las Mipymes.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

KIT Básico MiPymes - Clic Seguro Externo Recibidos x



Comunicaciones clicseguro <comunicacionesclicseguro@renata.edu.co>

19:46 (hace 9 minutos)



La Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA y el Ministerio de Tecnologías de la Información MinTIC en el marco de la iniciativa "Clic Seguro" que tiene como objetivo "*Mejorar las competencias en seguridad digital de las personas en general para aumentar la confianza en el uso del entorno digital.*", eligió a la institución que usted representa, para enviar un Kit básico de **Seguridad Digital**, lo invitamos a que revise el código QR adjunto.



1.3.6 Transferencia de conocimiento en seguridad digital a treinta (30) funcionarios del MinTIC con base a las temáticas propuestas dentro del anexo técnico.

Se crearon unos voucher que fueron entregados a la oficina de Mintic los cuales representan los cupos de los 30 funcionarios para participar de la Capacitación en Seguridad Digital.

Anexo 17: Oficio con la entrega de los Vaucher enviado al Ministerio

1.3.7 Monitoreo y evaluación continua con base a los KPIs formulados para brindar el alcance indicado en la meta de 30.000 ciudadanos.

Los KPIs se estuvieron monitoreando cada semana por cada uno de los ejes del proyecto como se muestra en la siguiente gráfica:



contactenos@renata.edu.co




Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

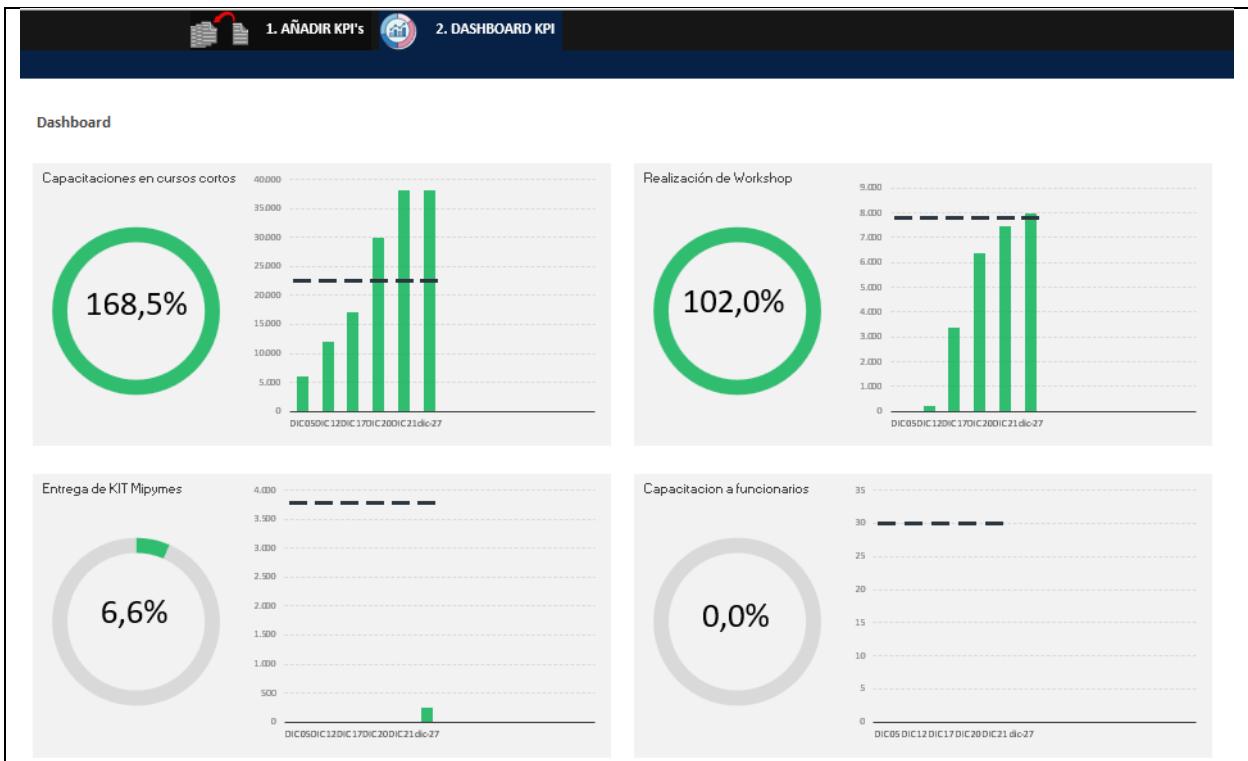

Número de esquema	Nombre	Peso	Semana 1 21 al 27 nov	Semana 2 27 Nov al 04 Dic	Semana 3 05 al 11 Dic	Semana 4 12 al 18 de Dic	Semana 5 19 al 25 de Dic	Semana 6 25 al 31 de Dic	Acumulado
1.4	FASE 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN								
1.4.1	Recopilar y analizar los datos obtenidos de la ejecución de los workshops y los cursos ofertados.	5%			1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	5,0%
1.4.2	Evaluar la satisfacción e impacto de las iniciativas en	5%				2,00%	2,00%	1,00%	5,0%



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	los beneficiarios							
1.4.3	Recopilar la base de datos del personal que asistió a los workshops	5%		2,00%	2,00%	1,00%		5,0%
1.4.4	Publicación de resultados obtenidos por medio de la actualización del micrositio que se desarrollará y proporcionará para el seguimiento en tiempo real del proyecto.	5%		1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	5,0%

1.4.1 Recopilar y analizar los datos obtenidos de la ejecución de los workshops y los cursos ofertados.

Anexo 18: Documento de recopilación y análisis de los datos obtenidos

1.4.2 Evaluar la satisfacción e impacto de las iniciativas en los beneficiarios

Para esta evaluación se creó un código QR que dirige a los participantes a la encuesta de satisfacción de las actividades:



1.4.3 Recopilar la base de datos del personal que asistió a los workshops

Anexo N. 19: Listado de las **7957** personas asistentes a la fecha:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1.4.4 Publicación de resultados obtenidos por medio de la actualización del micrositio que se desarrollará y proporcionará para el seguimiento en tiempo real del proyecto.

Número de esquema	Nombre	Peso	Semana 1 21 al 27 nov	Semana 2 27 Nov al 04 Dic	Semana 3 05 al 11 Dic	Semana 4 12 al 18 de Dic	Semana 5 19 al 25 de Dic	Semana 6 25 al 31 de Dic	Acumulado
1.5	FASE 5: CONTINUIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS								
1.5.1	Ejecutar en las regiones priorizadas un total de trece (13) workshops	6%			1,00%	3,00%	2,00%		6,0%
1.5.2	Entregar los kits desarrollados para apoyar a las entidades y MiPyme	6%				3,00%	3,00%		6,0%
1.5.3	Socialización de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto a los directamente responsables dentro del MinTIC.	4%					2,00%	2,00%	4,0%
1.5.4	Entrega Final y Socialización de Resultados - Proyecto Clic Seguro	4%						4,00%	4,0%

1.5.1 Ejecutar en las regiones priorizadas un total de trece (13) workshops



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

La programación coordinada con los profesionales de campo es la siguiente:

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	Total Participantes vs I semana					
					1	2						
3	4	5	6	7	8	9						
			Dip. Quindío Armenia TP: 141 Speaker: Diego Estuardo Coord: Andress Pareja				141					
10	11	12	13	14	15	16						
		Dip. Cesar Pueblo Bello TP: 52 Speaker: Leticia Acosta Coord: Christian Rojas	Dip. la Guajira Inízico TP: 39 Speaker: Leticia Acosta Coord: Christian Rojas	Dip. Cesar Manizales TP: 50 Speaker: Leticia Acosta Coord: Christian Rojas	Dip. Quindío Armenia TP: 92 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Caldas Caldas TP: 52 Speaker: Leticia Acosta Coord: Andress Pareja	Dip. Nte Santander Córdoba TP: 100 Speaker: James Alberto Gutierrez Coord: Gustavo Romero	Dip. Nte Santander Córdoba TP: 92 Speaker: James Alberto Gutierrez Coord: Gustavo Romero	Dip. Nte Santander Córdoba TP: 100 Speaker: James Alberto Gutierrez Coord: Gustavo Romero	Dip. Nte Santander Córdoba TP: 92 Speaker: James Alberto Gutierrez Coord: Gustavo Romero	122	
17	18	19	20	21	22	23						
Dip. Nte Santander Córdoba - Los Patios TP: 100 Hora: 10 a 12pm Lugar: Hotel Spk: Diego Barbosa Coord: Gustavo Romero	Dip. Nte Santander Cáceres TP: 100 Hora: 10 a 12pm Lugar: Hotel Spk: Diego Barbosa Coord: Gustavo Romero	Dip. Cundinamarca Chamá Fundación La Luz TP: 100 Hora: 9 a 12pm Lugar: Hotel Spk: Harold Romero Coord: Elizabeth Sanchez	Dip. Quindío Armenia TP: 100 CC: Cartago Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Tolima Flamazadas TP: 90 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Quindío Chaparral TP: 95 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Tolima Ricoblanco TP: 95 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Quindío Armenia TP: 95 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Cundinamarca Supatá TP: 100 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Areca Tunja TP: 100 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Quindío Armenia TP: 100 Speaker: Harold Romero Coord: Andress Pareja	Dip. Bogotá D.C. Minuto de Plata TP: 100 Speaker: Por Definir Coord: Erika Cadena	2470
24	25	26	27	28	29	30						
31							3824					

Fuente: Elaboración propia

Las siguientes convenciones aportan a la comprensión de la tabla:

Realizado	
Programado	
TP	Total participantes
Spk	Moderador
Coord	Coordinador de zona

A la fecha se han realizado los siguientes workshop:

N.	Fecha del workshop	Departamento	Ciudad	Coordinador	Cantidad de asistentes	Informe en el que se reporta
1	6/Dic/23	Quindío	Armenia	Andrés Pareja	141	2
2	12/Dic/23	Cesar	Pueblo Bello	Christian Rojas	83	2



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

3	13/Dic/23	La Guajira	San Juan	Christian Rojas	357	2
4	14/Dic/23	Cesar	Manaure	Christian Rojas	86	3
5	15/Dic/23	Caldas	Chinchiná	Andres Pareja	92	3
6	15/Dic/23	Quindío	Armenia	Andrés Pareja	129	3
7	15/Dic/23	Norte de Santander	Cúcuta	Gustavo Romero	244	3
8	15/Dic/23	Norte de Santander	Los Patios	Gustavo Romero	533	3
9	15/Dic/23	Norte de Santander	Labateca	Gustavo Romero	106	4
10	15/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	165	4
11	15/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	100	4
12	16/Dic/23	Norte de Santander	Ocaña	Gustavo Romero	299	3
13	16/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	167	4
14	16/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	327	3
15	17/Dic/23	Norte de Santander	Ocaña	Gustavo Romero	212	4
16	17/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	128	4



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

17	17/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	133	4
18	17/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	334	4
19	18/Dic/23	Atlántico	Barranquilla	Luis Ernesto Oñate	93	4
20	18/Dic/23	Cundinamarca	Chinauta	Elizabeth Sanchez	296	4
21	18/Dic/23	Cesar	Villanueva	Christian Rojas	83	4
22	18/Dic/23	Norte de Santander	Ocaña	Gustavo Romero	224	4
23	19/Dic/23	Norte de Santander	Cúcuta	Gustavo Romero	679	4
24	19/Dic/23	Cesar	Valledupar	Christian Rojas	200	4
25	19/Dic/23	Quindío	Armenia	Andres Pareja	161	4
26	19/Dic/23	Tolima	Espinal	Gustavo Romero	100	4
27	19/Dic/23	Tolima	Ibagué	Gustavo Romero	308	4
28	19/Dic/23	Valle	Cartago	Andrés Pareja	115	4
29	20/Dic/23	Quindío	Armenia	Andrés Pareja	202	5
30	20/Dic/23	Tolima	Chaparral	Gustavo Romero	162	5



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353

Contáctenos



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

31	21/Dic/23	Cesar	Valledupar	Christian Rojas	454	5
32	21/Dic/23	Meta	Villavicencio	Elizabeth Sanchez	50	5
33	21/Dic/23	Quindío	Armenia	Andrés Pareja	228	5
34	21/Dic/23	Tolima	Rioblanco	Gustavo Romero	415	5
35	22/Dic/23	Arauca	Tame	Henry Quiceno	50	5
36	22/Dic/23	Cundinamarca	Supatá	Elizabeth Sanchez	148	5
37	22/Dic/23	Quindío	Armenia	Andrés Pareja	37	5
Total asistentes a la fecha					7.957	

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestra la distribución y el cumplimiento diario a la meta con el desarrollo de los workshop en las diferentes regiones del país.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Departamento	Municipio	6-dic	12-dic	13-dic	14-dic	15-dic	16-dic	17-dic	18-dic	19-dic	20-dic	21-dic	22-dic	TOTAL
Arauca	Tame													20
Atlántico	Barranquilla								93					93
Caldas	Chinchiná						92							92
	Manaure Balcón Del Cesar				86									86
Cesar	Pueblo Bello		83							201		513		83
	Valledupar								201					714
Cundinamarca	Fusagasugá							296						296
	Supatá												165	165
La Guajira	San Juan Del Cesar			357										357
	Villanueva							83						83
Meta	Villavicencio											280		280
	Cúcuta				244				679					923
Norte de Santander	Labateca					106								106
	Los Patios					533								533
	Ocaña						299	212	224					735
Quindío	Armenia	141				129				161	202	228	76	937
	Chaparral					165		128			162			455
Tolima	Espinal					100	167	133		100				500
	Ibagué						327	334		308				969
	Rioblanco											415		415
Valle del Cauca	Cartago									115				115
	TOTAL	141	83	357	86	1369	793	807	696	1564	364	1436	261	7957

Fuente: Elaboración propia



Workshop N. 1:

El pasado 6 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de **Armenia** el workshop N.1 en donde participó a un grupo de jóvenes que alcanzan los 141 asistentes.

El evento tuvo una duración de 3 horas

La charla fue impartida por: El viceministro Diego Dorado

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.1



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Así mismo se logró el video testimonial que se encuentra cargado en la siguiente URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1GYWTmPzZwVZg2jCwYfwrhgRt0Brh_oHg?usp=sharing



Workshop N. 2:

El pasado 12 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Pueblo Bello (Cesar) el workshop N.2 en donde participaron 152 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.2</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.2</i>

Workshop N. 3:

El pasado 13 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en San Juan (La Guajira) el workshop N.3 en donde participaron 83 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>
	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>



contactenos@renata.edu.co


Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

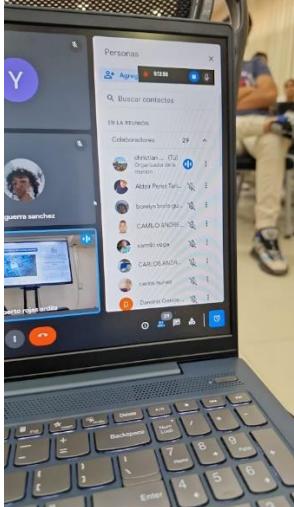	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.3</i>

Workshop N. 4:

El pasado 14 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Manaure (Cesar) el workshop N.4 en donde participaron 86 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.4</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.4</i>



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

		
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.4</p>		<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.4</p>

Workshop N. 5:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Chinchiná (Caldas) el workshop N.5 en donde participaron 92 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

		
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.5</p>		<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.5</p>



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.5

Workshop N. 6:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Armenia (Quindío) el workshop N.6 en donde participaron 91 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.6



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.6



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.6

Workshop N. 7:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Cúcuta (Norte de Santander) el workshop N.7 en donde participaron 132 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.7



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.7



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Workshop N. 8:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Los Patios (Norte de Santander) el workshop N.8 en donde participaron 278 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.8

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.8



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.8

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.8



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Workshop N. 09:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Labateca (Norte de Santander) el workshop N.9 en donde participaron 106 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Workshop N. 10:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Chaparral (Tolima) el workshop N.10 en donde participaron 165 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Heidy Serrato

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.10	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.10
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.10	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.10

Workshop N. 11:

El pasado 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Espinal (Tolima) el workshop N.11 en donde participaron 100 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Wilfredy Cardozo

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.11



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.11

Workshop N. 12:

El pasado 16 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Ocaña (Norte de Santander) el workshop N.12 en donde participaron 299 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.9

Workshop N. 13:

El pasado 16 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Espinal (Tolima) el workshop N.13 en donde participaron 167 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Wilfredy Cardozo

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.13



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.13

Workshop N. 14:

El pasado 16 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Ibagué (Tolima) el workshop N.14 en donde participaron 327 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.14



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.14



contactenos@renata.edu.co




Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

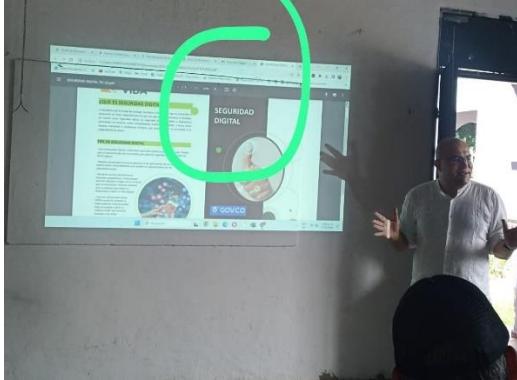	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.14</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.14</i>

Workshop N. 15:

El pasado 17 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Ocaña (Norte de Santander) el workshop N.15 en donde participaron 212 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.15</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.15</i>



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Workshop N. 16:

El pasado 17 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Chaparral (Tolima) el workshop N.16 en donde participaron 128 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Heidy Serrato

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.16	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.16



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Workshop N. 17:

El pasado 17 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Espinal (Tolima) el workshop N.17 en donde participaron 133 ciudadanos.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Wilfrey Cardozo

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.17</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.17</i>

Workshop N. 18:

El pasado 17 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué (Tolima) el workshop N.18 en donde participaron 334 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Paulina Ortiz

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.18	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.18
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.18	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.18

Workshop N. 19:

El pasado 18 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Barranquilla (Atlántico) el workshop N.19 en donde participaron 93 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por:

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.19	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.19
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.19	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.19

Workshop N. 20:

El pasado 18 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Chinauta (Cundinamarca) el workshop N.20 en donde participaron 296 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Harold Romero

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.13</p>	 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.13</p>
 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.20</p>	 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.20</p>
 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.20</p>	 <p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.20</p>
<p>Workshop N. 21:</p> <p>El pasado 18 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Villanueva (La Guajira) el workshop N.21 en donde participaron 83 ciudadanos.</p>	



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Invitación al evento:



INVITAN A:

**ESPACIO DE FORMACIÓN EN
CIBERSEGURIDAD PARA LOS SECTORES
GOBIERNO Y ACADEMIA**

18 de Diciembre

10:00 AM

TIMIRIWAKOS PLAZA- BARRIO BLANCA MARTINEZ
VILLANUEVA

CERTIFICA MINTIC



Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.21	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.21



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.21	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.21

Workshop N. 22:

El pasado 18 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Ocaña (Norte de Santander) el workshop N.22 en donde participaron 224 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.22



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.22



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.22

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.22

Workshop N. 23:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Cúcuta (Norte de Santander) el workshop N.23 en donde participaron 679 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.23</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.23</i>

Workshop N. 24:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Valledupar (Cesar) el workshop N.24 en donde participaron 201 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Evidencias fotográficas de la realización del evento:

	
<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</i>	<i>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</i>



contactenos@renata.edu.co




Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

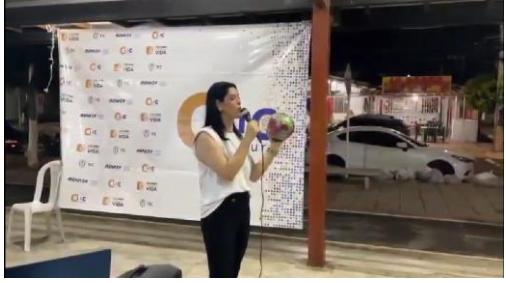	
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</p>	<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</p>
	
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</p>	<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.24</p>

Workshop N. 25:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Armenia (Quindío) el workshop N.25 en donde participaron 161 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andres Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Workshop N. 26:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Espinal (Tolima) el workshop N.26 en donde participaron 100 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Wilfredy Cardozo

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

		
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.26		Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.26

Workshop N. 27:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Ibagué (Tolima) el workshop N.27 en donde participaron 308 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Jaime Barreto

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

		
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27		Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27
		
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.27	

Workshop N. 28:

El pasado 19 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en Cartago (Valle) el workshop N.28 en donde participaron 115 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Ana Maria Rodriguez

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Workshop N. 29:

El pasado 20 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Armenia (Quindío) el workshop N.29 en donde participaron 202 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Andrés Calderón

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co




Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

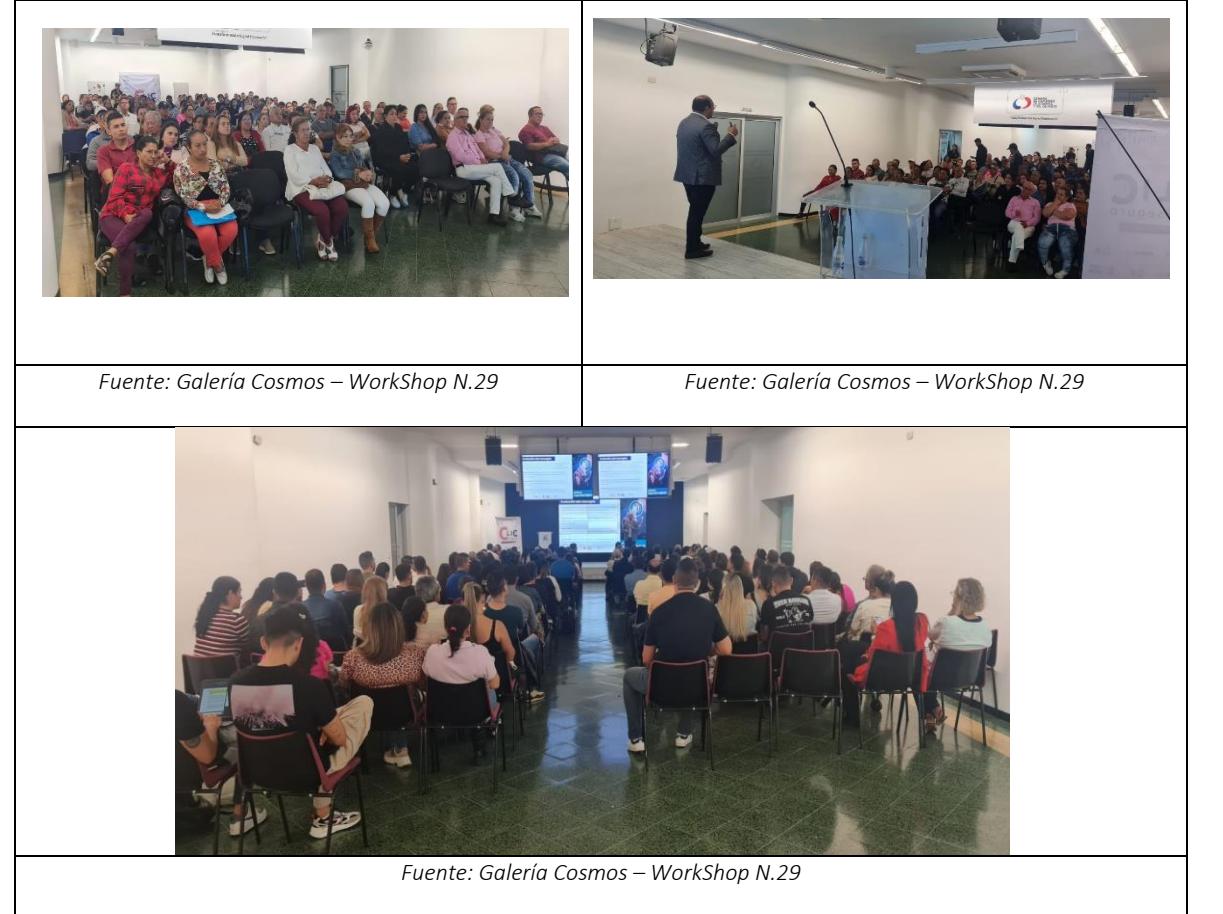

Workshop N. 30:

El pasado 20 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Chaparral (Tolima) el workshop N.30 en donde participaron 162 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Harold Romero

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Invitación publicada en la página de la Alcaldía

10:59 10:59

Publicación de Alcaldia...

Alcaldia Municipal de Chaparral 18 h ·

TALLER FORMATIVO SOBRE CIBERSEGURIDAD 2023

Se invita a todos los Grupos de Valor de #Chaparral y sur del #Tolima a este importante espacio de formación sobre Ciberseguridad.

Toda la info en: <https://shorturl.at/gkyCF>

Se brindará refrigerio para los asistentes y se expedirán los respectivos certificados de participación.

No te pierdas esta gran oportunidad.

#ChaparralSiTieneQuienLoQuiera

Invitan:

RENATA,
MINTIC,
PALOALTO
y
HUGO FERNANDO ARCE HERNÁNDEZ
Alcalde

1 6

Enviar mensaje a Alcaldia Muni...

Carta enviada a la secretaría TIC de la alcaldía:

Invitación desarrollo Workshop



Erika Viviana Casas Gonzalez <v.casas@renata.edu.co>

Para sistemas@chaparral-tolima.gov.co

CC Alejandro Jimenez; GINNA GARZON; Maria Angelica Lopez Ahumada; angel.a.ramos@corpocosmos.org;

gerencia@corpocosmos.org

ⓘ Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



Carta de invitacion workshop clic seguro - Chaparral.pdf

183 KB

Responder Responder a todos Reenviar ...

Lunes 18/12/2023 1:29 p. m.

Buenas tardes estimados

Reciban un cordial saludo

Me permito adjuntar la carta de invitación para el desarrollo del Workshop, quedamos atentos a su respuesta.

Quedo atenta, gracias

Cordialmente,

Erika Viviana Casas Gonzalez

[redacted] No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que e...

Directora de Proyectos | Project Manager



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.30

Workshop N. 31:

El pasado 21 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar (Cesar) el workshop N.31 en donde participaron 513 ciudadanos.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Invitación al evento



INVITAN A:

ESPAZIO DE FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD PARA LOS SECTORES GOBIERNO Y ACADEMIA

21 de Diciembre

4:30 PM

AUDITORIO PABLO OLIVEROS (UNIVERSIDAD ÁREA ANDINA)
VALLEDUPAR

CERTIFICA MINTIC



Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>	<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>
	
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>	<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>
	
<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>	<p>Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.31</p>

Workshop N. 32:

El pasado 21 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio (Meta) el workshop N.32 en donde participaron 280 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Omaira Vanegas

Contáctenos



contactenos@renata.edu.co



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.32



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.32

Workshop N. 33:

El pasado 21 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Armenia (Quindío) el workshop N.33 en donde participaron 228 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Ana Maria Rodriguez

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.33



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.33

Workshop N. 34:

El pasado 21 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Rioblanco (Tolima) el workshop N.34 en donde participaron 415 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Leticia Acosta

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.34



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.34



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Workshop N. 35:

El pasado 22 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Tame (Arauca) el workshop N.35 en donde participaron 20 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Diego Barbosa

Invitación del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35

Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.35



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Workshop N. 36:

El pasado 22 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en el municipio de Supatá (Cundinamarca) el workshop N.36 en donde participaron 165 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Harold Romero

Invitación al evento:

Re: Invitación Worshop Municipio Supatá Cundinamarca

EV Erika Viviana Casas Gonzalez <v.casas@renata.edu.co>
Para: Andrea Duarte
CC: Alejandro Jimenez; GINNA GARZON; Maria Angelica Lopez Ahumada; angelia.ramos@corpocosmos.org; gerencia@corpocosmos.org

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimada Andrea

Reciba un cordial saludo

En nombre de la corporación RENATA expresamos nuestros agradecimientos por abrir este espacio en su municipio.

Teniendo en cuenta la fecha propuesta lo haremos ese día, nos vemos pronto!

Nuevamente gracias

Feliz tarde

Cordialmente,

Erika Viviana Casas González

No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el enlace de correo electrónico y la dirección de correo electrónico están bien escritos y las ubicaciones correctas.

Correo electrónico: v.casas@renata.edu.co

Móvil: (+57) 3123278133

Teléfono: (+57) 1 5185353

Calle 73 # 7 – 31, Piso 2, Torre B

Bogotá D.C. – Colombia

Responder Responder a todos Reenviar ...

jueves 14/12/2023 4:43 p. m.

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36
	
Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36	Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.36

Workshop N. 37:

El pasado 22 de diciembre de 2023 se llevó a cabo en la ciudad de Armenia (Quindío) el workshop N.37 en donde participaron 76 ciudadanos.

El evento tuvo una duración de 2 horas

La charla fue impartida por: Gabriel Moreno

Evidencias fotográficas de la realización del evento:



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.37



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.37



Fuente: Galería Cosmos – WorkShop N.37

Los videos testimoniales se encuentran cargados en la siguiente URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zi_HjeGw4ywE5hUHrEqXH1hT9gVJaqH

Enlace a los videos de ejecución

https://drive.google.com/drive/folders/1W1x_bqKP1NBxEXWUBD6XtVeJ1AQ_FOR5

B3. AVANCE DE ASPECTOS JURIDICOS

En reconocimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas en el convenio se reconoce el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas:

TERCERA. - COMPROMISOS GENERALES DE RENATA: Para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, RENATA tendrá los siguientes compromisos generales:



contactenos@renata.edu.co

Contáctenos



(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

1. Cumplir con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos Personales, Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los Servicios y Tratamiento de la Información de la Entidad, de conformidad a la Ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto 1074 de 2015 Resolución No. 448 de 2022 y demás normas que apliquen.
2. Salvaguardar los activos de información del Ministerio/Fondo Único de TIC.
3. Suscribir el documento de compromiso de confidencialidad.
4. Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.
5. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en su propuesta, observando en todo momento la constitución política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad contratante.
6. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.
7. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato.
8. Responder ante terceros por los daños que se occasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del Fondo, obligándose desde ya el contratista a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.
10. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el informe de las actividades realizadas durante el mes o periodo, al igual que los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
12. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.
13. Informar sobre peticiones o amenazas de que sea objeto por quienes actúen por fuera de la ley, con el propósito de obligarlo a hacer o a omitir algún acto o hecho, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable de la supervisión y control de ejecución, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
14. Realizar las actividades asignadas.
15. Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro y expedición de paz y salvos.
16. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique.
17. Realizar los aportes ofrecidos para la ejecución del convenio, según la propuesta que hace parte integral del mismo.
18. Dar los créditos al Ministerio TIC/Fondo Único de TIC en todos los eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este convenio.
19. Desarrollar las actividades propias de la gestión para la realización del presente convenio con el acompañamiento permanente del Ministerio TIC/Fondo Único de TIC.
20. Presentar, previo a la realización de cada desembolso, los informes financieros acompañados de los soportes correspondientes, incluida la relación de gastos efectuada con los recursos derivados de la ejecución del convenio, como condición para realizar dichos desembolsos.
21. Presentar los informes de seguimiento semanales a las actividades propias del convenio, donde se relacione entre otros, el estado de las convocatorias, el número de



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

- certificaciones de asistencia, y certificaciones de aprobación en los casos que aplique, obtenidas por los beneficiarios.
22. Presentar los informes mensuales que deberán incluir como mínimo
- Tablero de control que dé cuenta del avance general del convenio, así como de los componentes técnico, financiero y administrativo.
 - Reporte con el cumplimiento de metas, alertas de incumplimiento y planes de choque si aplica.
 - Informe financiero que dé cuenta del compromiso, ejecución presupuestal y financiera de los recursos.
23. Presentar un informe final consolidado de ejecución financiera y de gestión al finalizar el plazo de ejecución del convenio.
- En este informe se deben recopilar los entregables definitivos, bases de datos, cifras y resultados, información para la liquidación del convenio, evidenciar el cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones, entre otros que se definan en el clausulado.
24. Atender solicitudes en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del convenio.
25. Reintegrar al finalizar el convenio, los rendimientos financieros de los recursos entregados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC que llegaren a generarse y los recursos no ejecutados del convenio, los cuales serán consignados en la cuenta que para tal efecto indique la entidad.
26. Abrir una cuenta especial para el manejo de los recursos del convenio.
27. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
28. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio.

CUARTA. - COMPROMISOS ESPECIALES DE RENATA:

1. Estructurar y entregar para aprobación del supervisor del convenio por parte del MinTIC/Fondo Único de TIC el cronograma de trabajo detallado para la correcta ejecución del objeto convenido, dicho plan de trabajo se deberá presentar dentro de los cinco (5) días posterior a la firma del acta de inicio.
2. Estructura y entrega del plan detallado de trabajo, máximo cinco (5) días después de la firma del acta de inicio del convenio. Se incluye en el cronograma de trabajo con el numeral 1.1.1.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

3. El ejecutor deberá hacer entrega del equipo mínimo para el desarrollo del proyecto y estará sujeto a aprobación previa a la suscripción del acta de inicio del Convenio.
4. Elaborar, analizar y entregar la documentación requerida bajo las buenas prácticas y lineamientos del PMI tales como: matriz de los riesgos asociados que deben tenerse en cuenta durante la ejecución del presente convenio, matriz de roles con la relación de los expertos, plan de comunicaciones y seguimiento al proyecto.
5. Presentar los informes técnicos y de seguimiento, en la periodicidad acordada con los actores del convenio, así mismo, asistir a las reuniones de seguimiento que se requieran durante la ejecución del objeto convenido.
6. Estructurar como parte integral de la ejecución del KickOff, la metodología en la ejecución del convenio, donde se indique la duración de cada etapa, el personal que interviene y los indicadores para la medición.
7. Desarrollar una estrategia de cobertura diseñada para un público objetivo, el cual deberá ser definido en conjunto con la supervisión del convenio por parte del MinTIC/Fondo Único de TIC, cuyo plan deberá enfocarse en la implementación y ejecución del proyecto de seguridad digital.
8. Desarrollar las siguientes actividades:

FASE 1: ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

- Identificar las necesidades, oportunidades y los desafíos que afrontan las diferentes regiones del país en cuanto a seguridad digital.
- ACTIVIDADES – FASE 1:
 - Análisis de mercado y necesidades regionales.
 - Definición de socios y colaboradores regionales y locales (Universidades, Cámaras de comercio, ACOPI, Cajas de compensación, Juntas de Acción comunal y Asociaciones de madres comunitarias).
 - Construcción de un mapa de ruta que contenga el temario de los cursos, workshop y multimedias enfocado al objetivo propuesto por el MinTIC.

FASE 2: DESARROLLO DE CONTENIDO Y HERRAMIENTAS

Crear los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo del objetivo plasmado en la presente propuesta.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

ACTIVIDADES – FASE 2:

- Diseño y desarrollo de programas de formación.
- Estructura de material requerido para la ejecución de los workshops acerca de la implementación de los lineamientos y mejores prácticas en seguridad digital haciendo énfasis en el Gestión de Riesgos e incidentes de seguridad digital.
- Estructurar el material didáctico de la política de seguridad digital.
- Estructurar las plantillas que permitan apoyar a las entidades y MiPyMES del territorio colombiano en el despliegue de la estrategia de comunicación interna.
- Creación de materiales de marketing y sensibilización.

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Desplegar las estrategias de formación, workshop y el micrositio a nivel nacional por medio de las campañas de divulgación propuestas dentro del alcance.

Para el caso de los workshops, se desplegarán inicialmente en la región central con el fin de obtener resultados y victorias tempranas.

Es importante tener en cuenta que la ejecución de los workshops en las demás regiones se realizará en la fase cinco (5) de la propuesta, posterior a validar los resultados obtenidos en la región central. Por otro lado, los cursos y material didáctico estarán publicados en el micrositio de acceso general a nivel nacional.

ACTIVIDADES – FASE 3:

Por medio de los canales y las diferentes campañas de comunicación de RENATA y MinTIC, propuestas para el desarrollo del proyecto, se crearán expectativas y se fomentará la participación en las distintas estrategias propuestas para fortalecer la seguridad digital en el país, especialmente en las siguientes regiones:

- Región Pacífico - Quibdó y Popayán.
- Región Eje Cafetero - Pereira y Manizales.
- Región Central - Bogotá e Ibagué.
- Región Caribe – Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
- Región de los Santanderes - Bucaramanga y Valledupar.
- Región Llanos - Villavicencio y Florencia.



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

- Región Amazonia - Leticia y Puerto Asís.
- Implementar bajo esquemas metodológicos especializados los programas de formación y sensibilización en seguridad digital para el desarrollo de cuatro (4) cursos enfocados en "Conceptos y medidas de prevención básicas de seguridad digital" dirigido a la ciudadanía colombiana.
- Publicación del material didáctico creado para la divulgación de la política de seguridad digital.
- Ejecutar un total de dos (2) workshops presenciales en la región central donde se invitarán a expertos en materia de seguridad digital para impartir los conceptos básicos y los principales lineamientos para la adecuada implementación de medidas para salvaguardar la información.
- Entregar los kits desarrollados para apoyar a las entidades y MiPyMes de la región central en el despliegue de la estrategia de comunicación interna por medio de los aliados estratégicos regionales.
- Transferencia de conocimiento en seguridad digital a treinta (30) funcionarios del MinTIC con base a las temáticas propuestas dentro del anexo técnico.
- Monitoreo y evaluación continua con base a los KPIs formulados para brindar el alcance indicado en la meta de 30.000 ciudadanos.

FASE 4: MONITOREO Y EVALUACIÓN

Evaluar el impacto y hacer ajustes según sea necesario.

ACTIVIDADES – FASE 4:

- Recopilar y analizar los datos obtenidos de la ejecución de los workshops y los cursos ofertados.
- Evaluar la satisfacción e impacto de las iniciativas en los beneficiarios.
- Recopilar la base de datos del personal que asistió a los workshops.
- Publicación de resultados obtenidos por medio de la actualización del micrositio que se desarrollará y proporcionará para el seguimiento en tiempo real del proyecto.

FASE 5: CONTINUIDAD DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Con base en las actividades de la Fase 4, se realizarán los ajustes pertinentes a las estrategias y se continuará el despliegue de estas a través de las campañas de divulgación propuestas dentro del alcance.

ACTIVIDADES – FASE 5:

- Ejecutar en las regiones priorizadas un total de trece (13) workshops donde se invitarán a expertos en materia de seguridad digital para impartir los conceptos básicos y los principales lineamientos para la adecuada implementación de medidas para salvaguardar la información.
- Entregar los kits desarrollados para apoyar a las entidades y MiPymes en las regiones indicadas para el despliegue de la estrategia de comunicación interna por medio de los aliados estratégicos regionales.
- Socialización de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto a los directamente responsables dentro del MinTIC.

B4. AVANCE DE ASPECTOS FINANCIEROS

FORMA DE DESEMBOLSO APORTES DEL FONDO ÚNICO DE TIC				
			Factura	Pago
Primer desembolso Fecha Tentativa: 15/11/2023	a. Firma de acta inicio y socialización del plan de trabajo y hoja de ruta. b. Aprobación de plan de trabajo y mapa de ruta c. Entrega de desarrollo y programa de formación d. Diseño instruccional y pedagógico de los workshops. e. Diseño instruccional y pedagógico de los cuatro (4) cursos virtuales de capacitación en seguridad digital.	40%	\$ 1.162.237.382	



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B - Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Segundo desembolso Fecha Tentativa: 30/11/2023	a. Desarrollo y entrega de resultados del componente de comunicaciones b. Entrega de los cuatro (4) cursos virtuales en seguridad digital. c. Desarrollo de mínimo once (11) workshops con alcance para 5.400 ciudadanos capacitados. d. Capacitación de 6.000 ciudadanos en los cursos virtuales de seguridad digital.	32%	\$ 929.789.905		
Tercer desembolso Fecha Tentativa: 15/12/2023	a. Desarrollo de cuatro (4) workshop con alcance para 2.400 ciudadanos capacitadas. b. Capacitación de 12.400 ciudadanos en los cursos virtuales de seguridad digital. c. Capacitación a treinta (30) funcionarios del MinTIC en seguridad digital. d. Socialización de resultados del proyecto y acta de cierre. e. Entrega de 3.800 kits de seguridad digital a entidades y MiPymes	28%	\$ 813.566.167		
VALOR DEL CONVENIO			\$ 2.905.593.454		

B.5 AVANCE DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Conclusiones

Recomendaciones

Firmas



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia

Erika Viviana Casas Gonzalez

Gerente de proyecto – Clic seguro



contactenos@renata.edu.co



Contáctenos

(601) 5185353



Calle 73 # 7 – 31 Torre B- Piso 2,
Bogotá D.C. - Colombia
